



R6.10.24撮影

コンクリート打設残り3回

工事の進捗状況

10月は、先月に引き続き砂防堰堤右岸側本体工のコンクリート打設及び、並行作業で鋼製堰堤部の型枠設置及び鉄筋組立て、1次コンクリート打設・鋼製スリット建込作業を行いました
 11月は、右岸側本体工のコンクリート打設が残り2回、鋼製堰堤部はスリット連結部のボルト設置後の塗装作業終了後、足場の解体作業を行い、2次コンクリート打設のための型枠設置及び鉄筋組立、コンクリート打設の作業を予定しています。
 コンクリート打設の数量が多い時には先月同様、早出作業を行います。住民の皆様には通行の際ご迷惑をお掛けしますが、安全第一で作業していきますので引き続きご理解ご協力のほどよろしくお願いします。




スリット部打設状況
 R6.10.11撮影

11月の生コン打設予定日

※3Dモデルによる
 11月施工予定箇所(着色部)

本体工打設予定日:6日(水) 7日(木)【予備日】8日(金)
 鋼製堰堤工打設予定:11月末予定

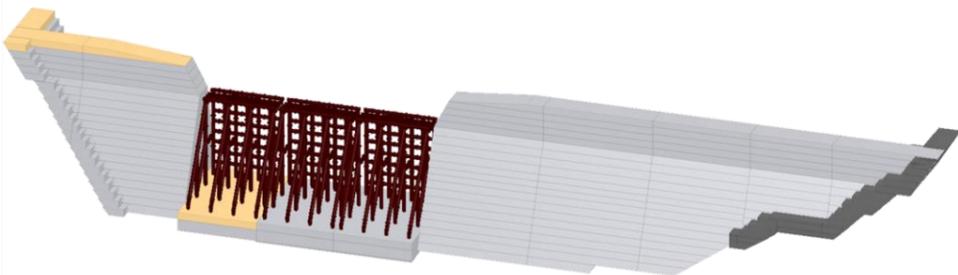

工事工程表

工期:令和6年3月1日~令和6年12月20日
 計画工程線 実施工程線

	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月
	10 20	10 20	10 20	10 20	10 20	10 20	10 20	10 20	10 20	10 20
準備工・後片付け	■									■
砂防土工 (右岸側掘削)		■	■	■	■			■		
コンクリート堰堤本体工		■	■	■	■	■	■	■	■	
鋼製堰堤工 (鋼製スリット部)									■	
コンクリート側壁工						■	■	■	■	
応急処理工									■	
仮設工 (足場盛土等)	■	■	■	■	■			■		

大曲地区安全パトロールに参加してきました

10月22日に第1回大曲地区安全パトロールが開催されました。対象現場は大曲国道管内舗装修繕工事【国道13号舗装修繕】と雄物川上流宇留井谷地地区下流災害復旧工事【雄物川築堤・護岸工事】の2件でした。
 当現場からも現場代理人の渡邊が参加し対象工事で行っている工夫や安全対策について現場作業員に報告があり、今後現場でも生かしていきたいと思いました。



大曲国道管内舗装修繕工事



雄物川上流宇留井谷地地区下流災害復旧工事

天候及び現場工程の変更等により、日程を変更する場合があります。
 市道黒沢野入口に週間の予定を掲載しておりますので、併せてご覧いただければと思います。
